

PROCES VERBAL DE RECEPTION AVANT MISE (OU REMISE) EN SERVICE ESCALIB MILLS HEXAGONAL

Assemblage et 1ère mise en service Déplacement Ajout ou suppression d'éléments

Seul l'installateur est autorisé à modifier l'Escalib Mills Hexagonal à la demande du donneur d'ordre.

Donneur d'ordre – Utilisateur :

Nom du chantier :

Localisation sur le chantier :

Nom du vérificateur :

DESRIPTIF DE L'ESCALIB MILLS HEXAGONAL


Hauteur desservie :

[1 ensemble : 4m90 maxi]
[2 ensembles : 7m90 maxi]
[2 ensembles : 9m40 maxi]

+ 3 poteaux 1.52m (015106-8)
+ 2 garde-corps (015107-6)]

CONTRÔLE DE L'ESCALIB MILLS HEXAGONAL

	Conformité	
	Oui	Non
1 Montage suivant : - La notice OU - Le plan n° du	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Assise au sol / Réglage des pieds.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Horizontalité / verticalité de l'Escalib hexagonal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Orientation de l'Escalib hexagonal suivant la hauteur de la dalle à desservir. Sortie entièrement sécurisée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Accessibilité au pied de l'Escalib par au moins 1 des 2 faces d'entrée (face principale A ou secondaire B).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Assemblage correct entre œillets des garde-corps et tenons des poteaux.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Présence indispensable des 5 poteaux de fermeture rouges.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Toutes les 3e lisses rouges mises en place (hors accès).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Amarrage de l'Escalib hexagonal conforme à la notice technique (avec 1 niveau d'amarrage jusqu'à 4m90 ou 2 niveaux d'amarrage au-delà) et/ou conforme au plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Aucun obstacle gênant dans la zone de circulation à l'intérieur de l'Escalib hexagonal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

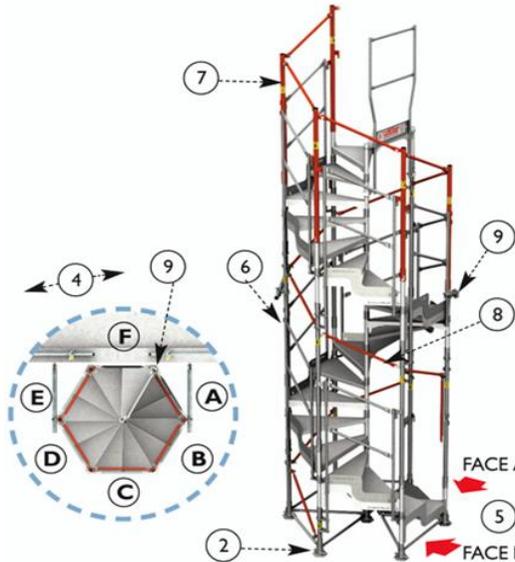

COMMENTAIRES

Pour toute case « NON » cochée, des modifications ou des remplacements devront être effectués avant utilisation de l'Escalib Mills hexagonal. Une nouvelle vérification sera programmée suite aux corrections d'un ou des éléments non-conformes.

AUTORISATION D'UTILISATION

Oui Non Date*

Visa du contrôleur :



82, RUE EDOUARD VAILLANT
93351 LE BOURGET CEDEX
T. : 01 48 35 65 65 - F. : 01 48 37 20 52



Respecter la notice technique Escalib Hexagonal disponible sur www.mills.fr

* A compter de ce jour, le donneur d'ordre assurera le gardiennage et le bon état de conservation de l'Escalib Mills Hexagonal jusqu'au démontage.
